

گزارش پیشرفت ماهانه پروژه مجتمع مسکونی «راز»

آذر ماه سال ۱۴۰۴




شریک سازنده: شرکت تعاونی سرپناه ساز رضوان

سازنده: شرکت ره آورد آتیه زمین

		گزارش پیشرفت ماهانه پروژه مجتمع مسکونی راز				
		صفحه	دوره گزارش	شماره گزارش		موضوع
		۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱		فهرست مطالب
فهرست مطالب						
	ردیف	عنوان			صفحه	
	۱	فهرست			۱	
	۲	گزارش پیشرفت شماتیک			۲	
	۳	شرح فعالیت های انجام شده			۳-۱۵	
	۴	برنامه ماه آینده			۱۶	
	۵	گزارش نیروی انسانی پروژه			۱۷-۱۸	
	۶	مشکلات و موانع پروژه			۱۹	
	۷	گزارش تصویری			۲۰-۲۳	
	۸					
	۹					
	۱۰					
	۱۱					
	۱۲					
	۱۳					
	۱۴					
	۱۵					
	۱۵					

گزارش پیشرفت شماتیک پروژه

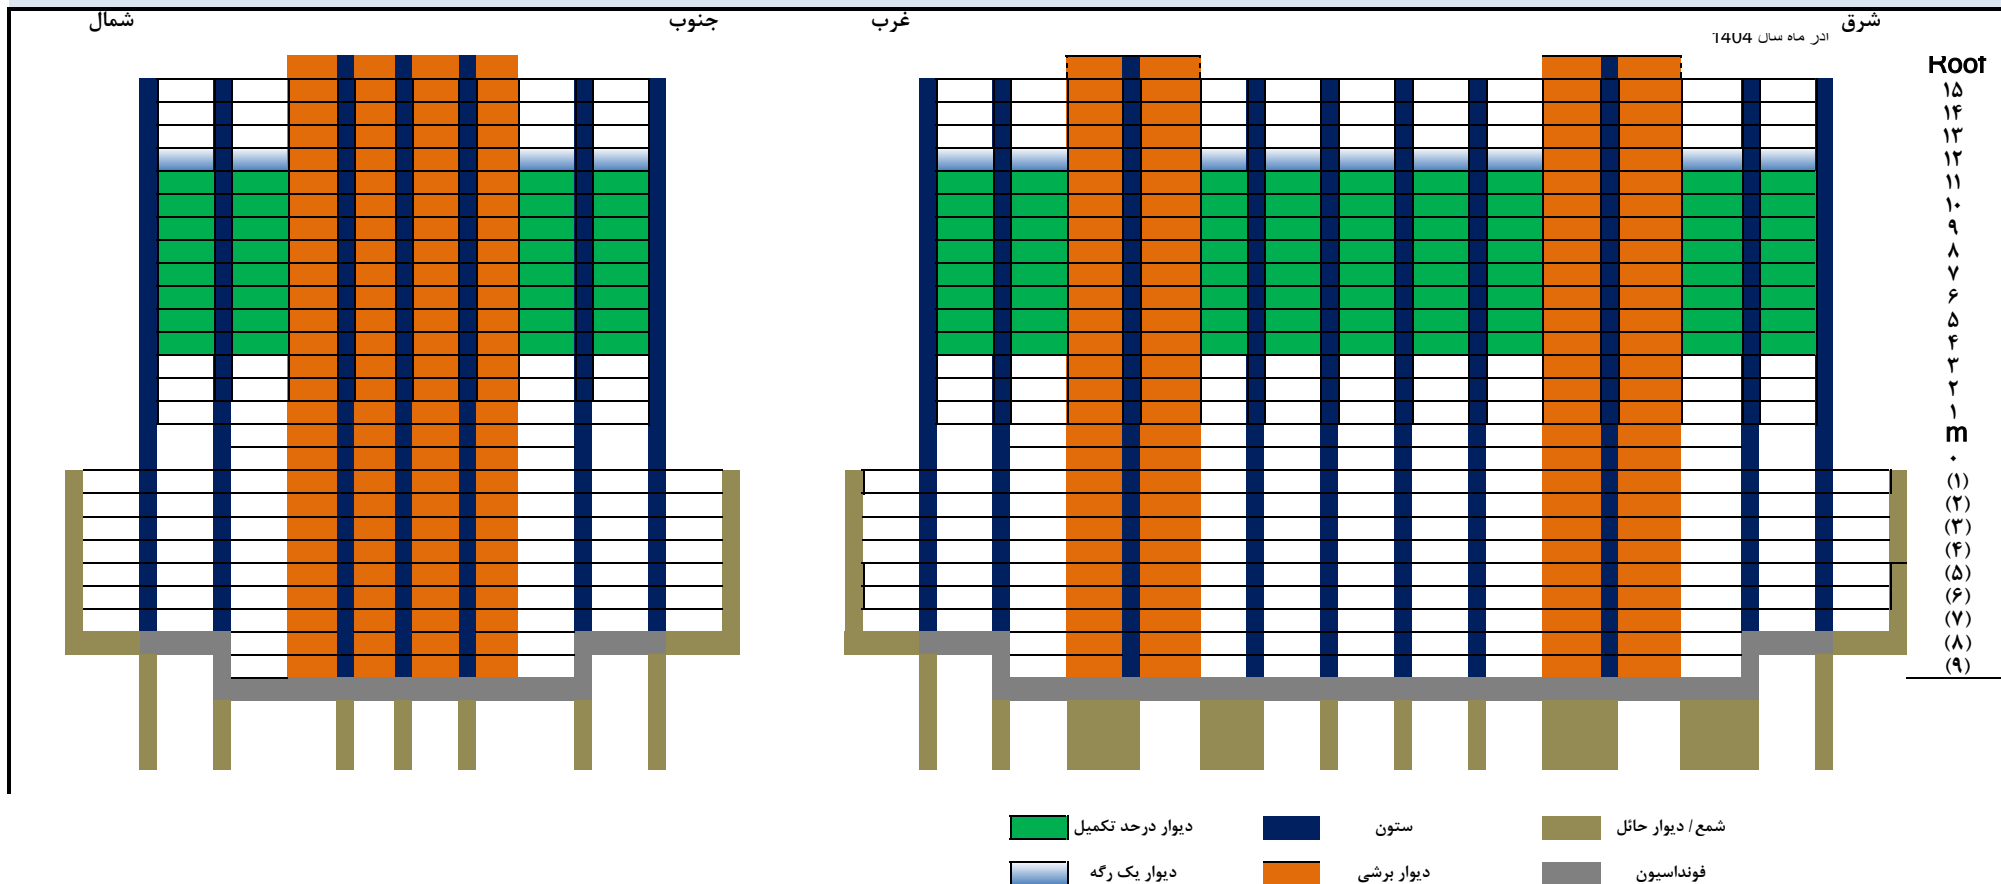

فعالیت های اجرای پروژه شهرراز در آذر ماه ۱۴۰۴


فعالیت های اجرای	عملیات اجرای ط منفی ۹	اسکلت بتنی	پاشش ضد حریق	دیوارچینی ، کربیری
۱۴۰۴/۰۹/۰۱	شنبه	ارت / قلوه ریزی پشت مخزن آب	—	دیوار چینی ط ۱۰ / اجرای ضد زنگ والپست ها در ط ۹ / دیوارچینی ط ۹ /
۱۴۰۴/۰۹/۰۲	یکشنبه	ارت / قلوه ریزی پشت مخزن آب	—	دیوارچینی ط ۹ / اجرای ضد زنگ والپست ها در ط ۹ / دیوار چینی ط ۱۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۳	دوشنبه	ارت / قلوه ریزی پشت مخزن آب	—	دیوارچینی ط ۹ / اجرای ضد زنگ والپست ها در ط ۹ / دیوار چینی ط ۱۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۴	سه شنبه	ارت / قلوه ریزی پشت مخزن آب / تست ارت مخزن استخر	اجرا واتر استاپ و آرماتور بندی استخر	دیوار چینی ط ۱۰ / آماده سازی وال پست ط ۱۰ /
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	چهارشنبه	بتن ریزی پشت مخزن آب /	—	دیوار چینی ط ۱۰ / آماده سازی وال پست ط ۱۰ / کُرنی ط ۱۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۶	پنج شنبه	بتن ریزی پشت مخزن آب	—	دیوار چینی ط ۱۰ / وال پست ط ۱۰ / کُرنی ط ۱۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۷	جمعه	تعطیل	—	تعطیل
۱۴۰۴/۰۹/۰۸	شنبه	بتن ریزی پشت مخزن آب /	—	دیوار چینی ط ۱۰ / وال پست ط ۱۰ / کُرنی ط ۱۱
۱۴۰۴/۰۹/۰۹	یکشنبه	بتن ریزی پشت مخزن آب - ۹ /	—	دیوار چینی ط ۱۰ /
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	دوشنبه	بتن ریزی پشت مخزن آب - ۹	—	آماده سازی پاشش ضد حریق ط ۱۵+ / اجرای شات ط ۱۵
۱۴۰۴/۰۹/۱۱	سه شنبه	—	—	اجرای شات ط ۱۵
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	چهارشنبه	—	آرماتور بندی استخر- ۹ / اجرای واتر استاپ - ۹	دیوارچینی ط ۹ / دیوار چینی ط ۱۰
۱۴۰۴/۰۹/۱۳	پنج شنبه	—	بتن ریزی کف استخر و پمپ خانه ط ۹ - (۳۲.۳۷ متر مکعب)	دیوار چینی ط ۱۰ / شروع والپست ط ۱۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۴	جمعه	—	—	—
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	شنبه	—	قالب بندی تصفیه خانه و استخر- ۹	دیوار چینی ط ۱۰ / دیوار چینی ط ۱۱ / والپست ط ۱۱

فعالیت های اجرای پروژه شهرراز در آذر ماه ۱۴۰۴

فعالیت های اجرای	عملیات اجرای ط منفی ۹	اسکلت بتنی	پاشش ضد حریق	دیوارچینی ، کربیری
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	یکشنبه	-	قالب بندی تصفیه خانه و استخر-۹	دیوار چینی ط ۱۰ / دیوار چینی ط ۱۱ / والپست ط ۱۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	دوشنبه	-	قالب بندی تصفیه خانه و استخر-۹	دیوار چینی ط ۱۰ / دیوار چینی ط ۱۱ / والپست ط ۱۱ / کُرنی ط ۱۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۸	سه شنبه	-	آرماتور بندی قالب بندی تصفیه خانه و استخر-۹ /	دیوار چینی ط ۱۰ / دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۱ /
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	چهارشنبه	-	آرماتور بندی قالب بندی تصفیه خانه و استخر-۹ /	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۱
۱۴۰۴/۰۹/۲۰	پنج شنبه	-	-	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۱
۱۴۰۴/۰۹/۲۱	جمعه	-	-	
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	شنبه	-	-	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۱
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	یکشنبه	-	آرماتور بندی قالب بندی تصفیه خانه و استخر-۹	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۱ /
۱۴۰۴/۰۹/۲۴	دوشنبه	-	بتن ریزی تصفیه خانه و استخر-۹	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	سه شنبه	-	جوشکاری و رابیتس بندی ط ۲ / جوشکاری و رابیتس بندی ط ۱	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۱ /
۱۴۰۴/۰۹/۲۶	چهارشنبه	-	-	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۱ /
۱۴۰۴/۰۹/۲۷	پنج شنبه	-	-	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۲
۱۴۰۴/۰۹/۲۸	جمعه	-	باز کردن قالب های ۹-	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۲ /
۱۴۰۴/۰۹/۲۹	شنبه	-	باز کردن قالب های ۹-	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۲ /
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یکشنبه	-	-	دیوار چینی ط ۱۱ / اجرای والپست ط ۱۲


چک لیست در یک نگاه مسکونی (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی				دیوار چینی پیرامونی		کرگیری	پرکردن داکت اضافه	نصب تیر کنسول	آرما تور و قالب کنسول	بتن کنسول (متر مکعب)
	یک رگ (متر طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)					
برآورد	۸۵۳۵	۲۳۰۲۵	۳۱۹۵	۷۰۵	۱۶۵۰	۵۸۵۰					۴۵
جمع کل انجام شده در طبقات	۳۶۱۸	۹۱۷۵	۱۳۴۹	۱۲۲	۱۱۷	۲۲۸			۰	۰	۶
درصد انجام شده در طبقات	۴۲٪	۴۰٪	۴۲٪	۱۷٪	۷٪	۴٪	۱۴٪	۰٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪
جمع کل انجام شده در طبقات	۴۲۰۹	۱۰۹۲۵	۱۶۲۸	۱۳۵	۱۴۴	۲۲۸			۰	۰	۶
درصد انجام شده در طبقات	۴۹٪	۴۷٪	۵۱٪	۱۹٪	۹٪	۴٪	۲۷٪	۱٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪
	تیم بنایی	تیم جوشکاری	تیم مهندسی	جمع کل	راهکار جهت تسریع در کار			گزارش تجمعی ورود مصالح کلیدی			
نفرات پیمانکار وال کریت هفته گذشته	۸	۲	۱	۱۱	تامین بلوک ۱۲ و ۸ جهت تکمیل دیوار چینی طبقه ۱۲						
نفرات پیمانکار وال کریت	۵	۲	۱	۸							

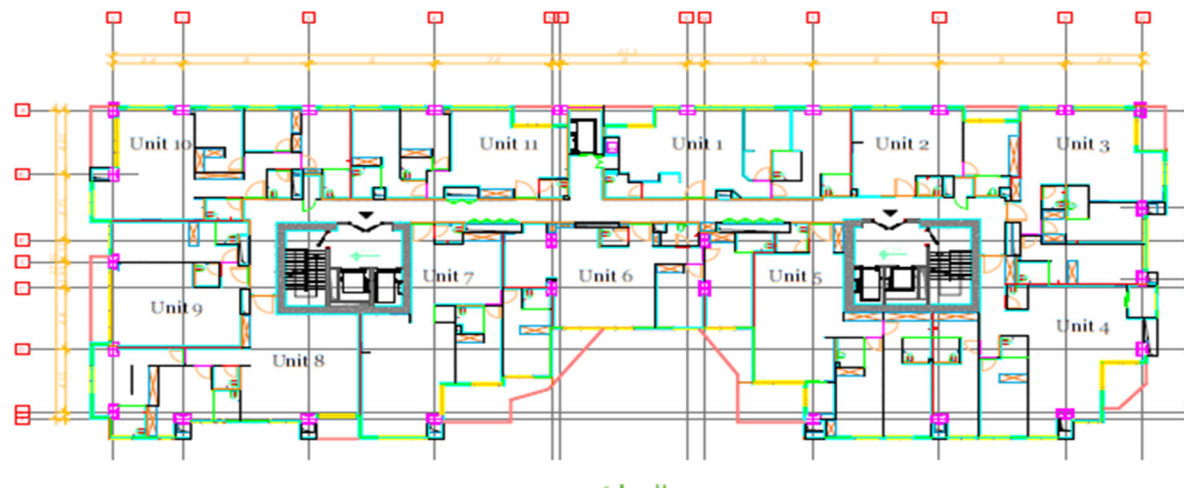


چک لیست در یک نگاه طبقه منفی ۹ (پهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	قلوه ریزی پشت مخزن آب	حفاری و مگر پمپ خانه	آرماتور بندی و بتن ریزی پمپ خانه	آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی استخر	تاسیسات قبل از بتن ریزی استخر	آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی استخر	خاکریزی و تسطیح منفی ۹	ارت	انتقال آب بین چاه ها	تخریب سقف ط منفی ۸ برای آسانسور	تخریب ستون جهت آماده سازی پاشنه ستون ها
استخر	۱۰۰٪			۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪		۱۰۰٪			
مخزن آب							۱۰۰٪	۹۵٪			
پمپ خانه		۱۰۰٪	۱۰۰٪				۶۰٪	۹۵٪	۲۰٪		
رختکن							۵۰٪	۹۵٪		۱۰۰٪	
سالن بازی							۱۰۰٪	۹۵٪			
لابی ورودی							۸۰٪	۹۵٪			
سینما							۱۰۰٪	۹۵٪			
آسانسور							۳۰٪	۹۵٪		۰٪	
جمع کل انجام شده در طبقه											
درصد انجام شده در طبقه	۷۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۷۴٪	۳۳٪	۲۰٪	۰٪	۱۰۰٪
درصد انجام شده در طبقه	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۴٪	۹۶٪	۲۰٪	۰٪	۱۰۰٪

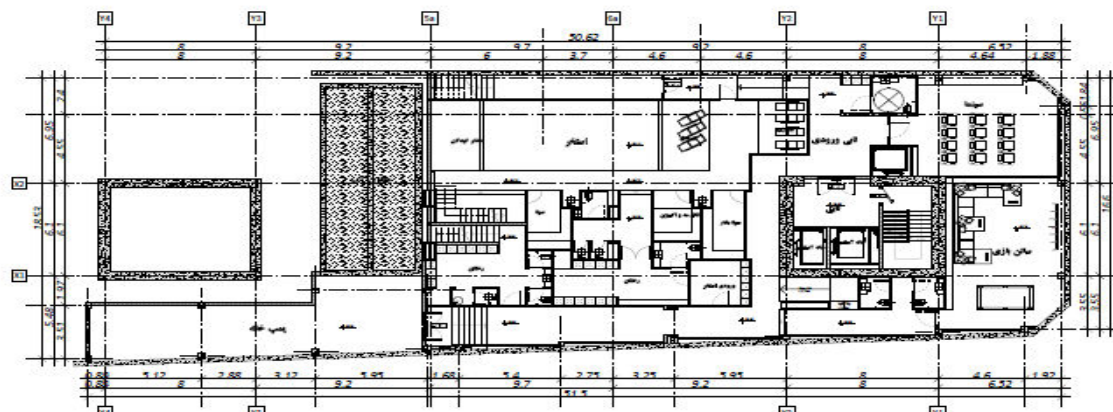


چک لیست در یک نگاه طبقه چهار مسکونی (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی					دیوار چینی پیرامونی		کرگیری	پرکردن داکت در صورت نیاز	نصب تیر کنسول	آرماتور و قالب کنسول	بتن کنسول (متر مکعب)
	یک رگ (متر طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)					
برآورد	۵۶۹	۱۵۳۵	۲۱۳	۴۷	۱۱۰	۳۹۰						۳
واحد ۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۶۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۱۰۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۱۰۰٪	۹۰٪	۹۵٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۱۰۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪	۳۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۱۰	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۲۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۱۱	۱۰۰٪	۹۵٪	۹۵٪	۷۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	۵۶۴	۱۴۴۴	۲۰۸	۱۵	۰	۰						۱
درصد انجام شده در طبقه دوره گذشته	۹۹٪	۹۴٪	۹۸٪	۳۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪
درصد انجام شده در طبقه	۹۹٪	۹۴٪	۹۸٪	۳۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪

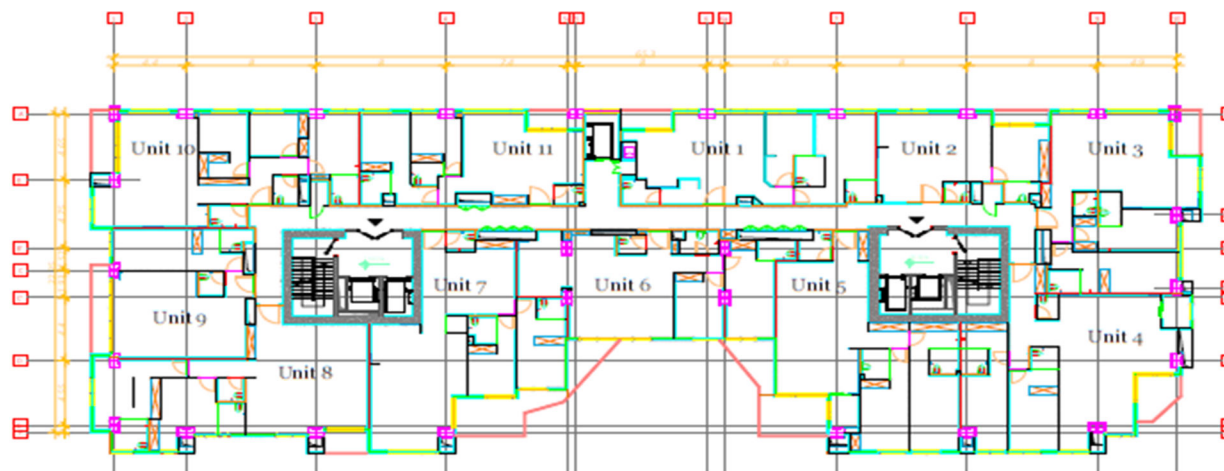


چک لیست در یک نگاه طبقه ۵ مسکونی (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جعبه های کاری	دیوار چینی داخلی					دیوار چینی پیرامونی		کرگیری	پرکردن داکت اضافه	نصب تیر کنسول	آرماتور و قالب کنسول	بتن کنسول (متر مکعب)
	یک رگ (طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)					
برآورد	۵۶۹	۱۵۳۵	۲۱۳	۴۷	۱۱۰	۳۹۰						۳
واحد ۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۷۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۵٪	۹۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۱۰۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۱۰	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۶۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۱۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۰٪	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	۵۶۶	۱۵۰۷	۲۱۲	۳۴	۲	۰						۱
درصد انجام شده در طبقه دوره گذشته	۱۰۰٪	۹۸٪	۱۰۰٪	۷۳٪	۲٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪
درصد انجام شده در طبقه	۱۰۰٪	۹۸٪	۱۰۰٪	۷۳٪	۲٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪

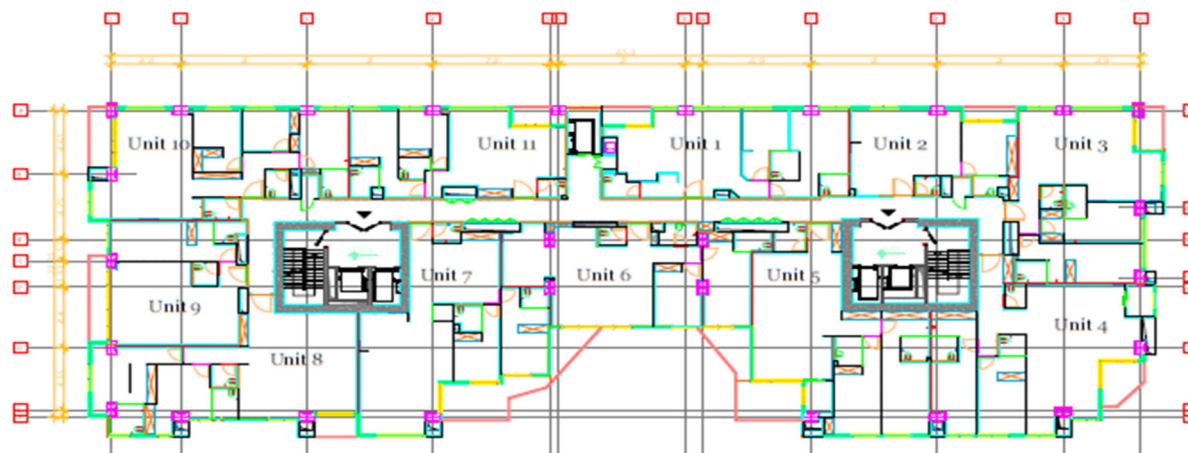


چک لیست در یک نگاه طبقه ۶ مسکونی (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی					دیوار چینی پیرامونی		کرگیری	پرکردن داکت اضافه	نصب تیر کنسول	آرماتور و قالب کنسول	بتن کنسول (متر مکعب)
	یک رگ (طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)					
برآورد	۵۶۹	۱۵۳۵	۲۱۳	۴۷	۱۱۰	۳۹۰						۳
واحد ۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۰٪	۱۰۰٪	۷۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۳۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۳۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۰٪	۶۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۶۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۸۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۱۰	۱۰۰٪	۹۵٪	۹۵٪	۸۰٪	۵۰٪	۰٪	۵۰٪	۵٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۱۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۰٪	۱۰۰٪	۶۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	۵۶۶	۱۵۲۱	۲۱۰	۴۴	۲۹	۶۷						۱
درصد انجام شده در طبقه دوره گذشته	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۹٪	۹۳٪	۲۶٪	۱۷٪		۴۶٪	۰٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪
درصد انجام شده در طبقه	۱۰۰٪	۹۹٪	۹۹٪	۹۳٪	۲۶٪	۱۷٪		۴۶٪	۰٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪

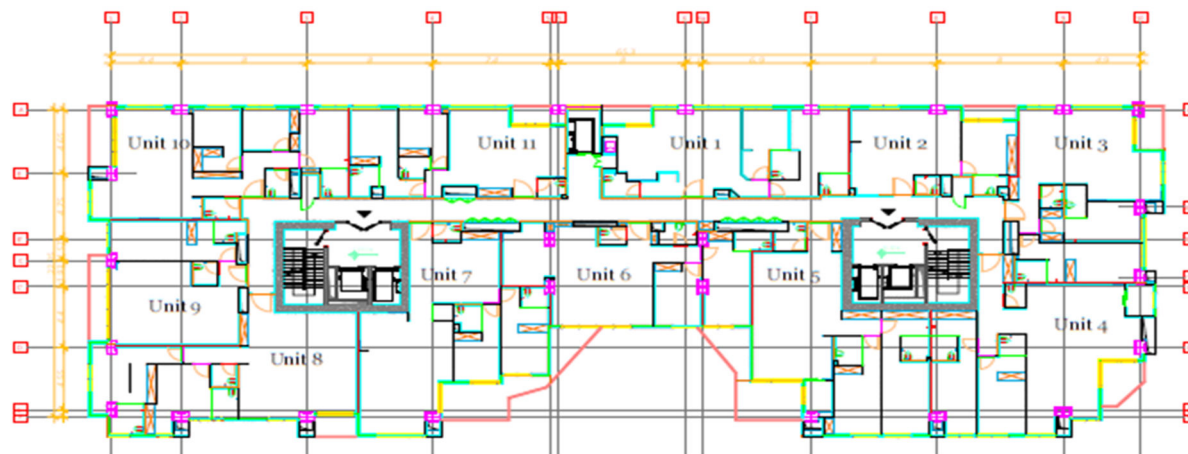


چک لیست در یک نگاه طبقه ۷ مسکونی (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی						دیوار چینی پیرامونی				پرکردن داکت اضافه	نصب تیر کنسول	آرماتور و قالب کنسول	بتن کنسول (مکعب)
	یک رگ (متر طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	کرگیری				
برآورد	۵۲۳	۱۴۱۲	۱۹۶	۴۲	۱۱۰	۳۹۰								۳
واحد ۱	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۹۰٪				۰٪	۲۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۹۰٪				۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۹۸٪	۹۸٪	۱۰۰٪	۷۵٪	۰٪	۰٪				۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۹۵٪	۹۵٪	۹۰٪	۸۰٪	۰٪	۰٪				۷۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۶۰٪	۰٪	۰٪				۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۹۸٪	۹۸٪	۹۸٪	۸۰٪	۰٪	۰٪				۰٪	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۵٪	۰٪	۰٪				۶۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۱۰۰٪	۹۸٪	۱۰۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪	۸۰٪				۳۰٪	۲۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۹۰٪	۹۰٪	۹۵٪	۵۰٪	۱۰۰٪	۸۰٪				۵۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	۵۰۸	۱۳۶۸	۱۹۱	۲۶	۴۹	۱۴۷								۲
درصد انجام شده در طبقه دوره گذشته	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۶۱٪	۴۴٪	۳۸٪				۲۴٪	۷٪	۲۸٪	۲۸٪	۷۸٪
درصد انجام شده در طبقه	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪	۶۱٪	۴۴٪	۳۸٪				۲۴٪	۷٪	۲۸٪	۲۸٪	۷۸٪

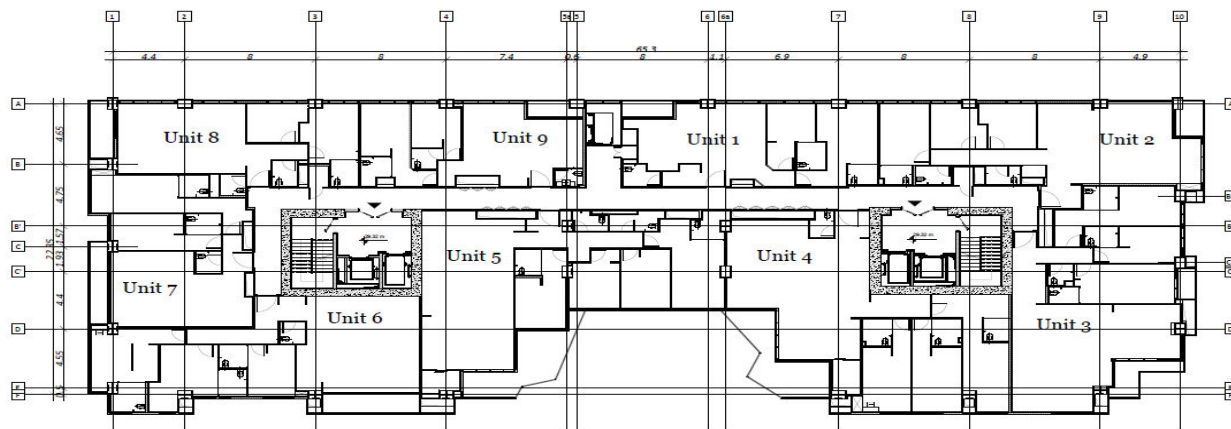


چک لیست طبقه هشتم (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی						کرگیری	پر کردن داکت اضافه	نصب تیر کنسول	آرمانتور و قالب کنسول	بتن کنسول (متر مکعب)
	یک رگ (متر طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)					
برآورد	۵۲۳	۱۴۱۲	۱۹۶	۴۲	۱۱۰	۳۹۰					۳
واحد ۱	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۸۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	۵۱۸	۱۳۷۳	۱۹۵	۰	۳۷	۱۳					۱
درصد انجام شده در طبقه دوره گذشته	۹۹٪	۹۷٪	۹۹٪	۰٪	۳۳٪	۳٪	۱۰۰٪	۹٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪
درصد انجام شده در طبقه	۹۹٪	۹۷٪	۹۹٪	۰٪	۳۳٪	۳٪	۱۰۰٪	۹٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪

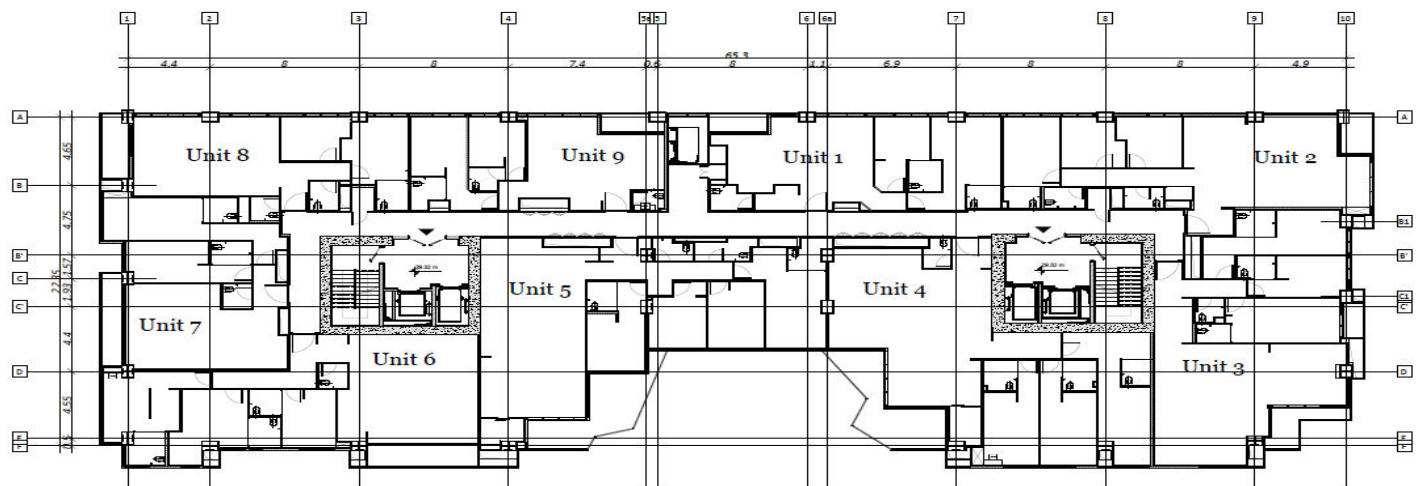


چک لیست طبقه نه (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی						پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)	یک رگ (متر طول)	کرگیری	پرکردن داکت اضافه	نصب تیر کنسول	آرمانتور و قالب کنسول	بتن کنسول (متر مکعب)
برآورد	۵۲۳	۱۴۱۲	۱۹۶	۴۲	۱۱۰	۳۹۰											۳
واحد ۱	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۱۰۰٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	۵۲۳	۱۳۵۷	۱۹۶	۰	۰	۰											۱
درصد انجام شده در طبقه دوره گذشته	۱۰۰٪	۹۶٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪							۰٪	۰٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪
درصد انجام شده در طبقه	۱۰۰٪	۹۶٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪							۳۳٪	۰٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪

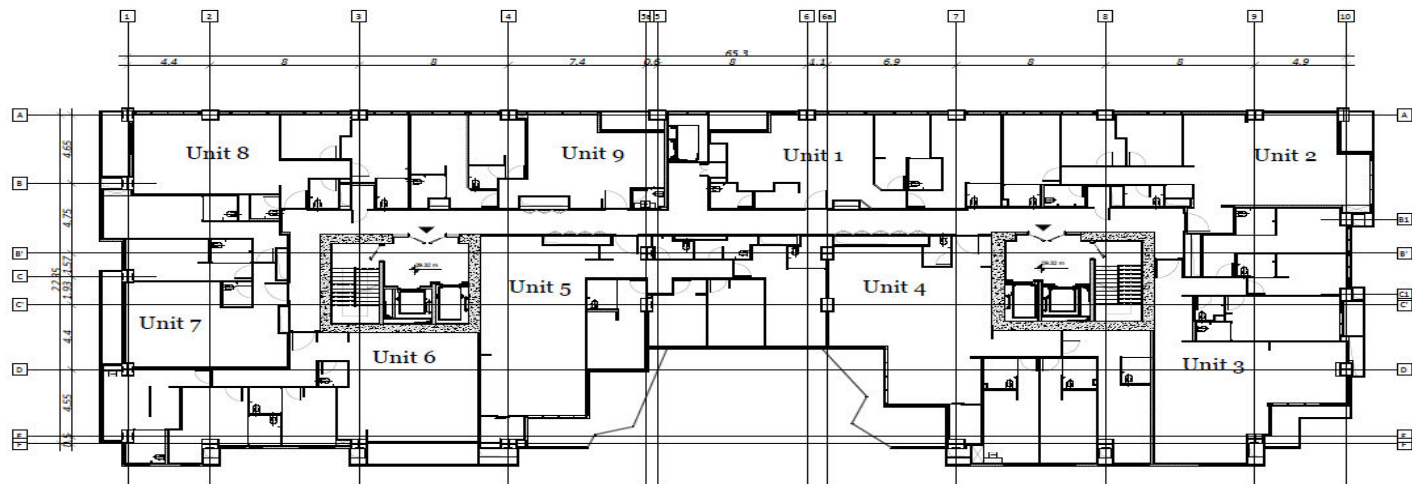


چک لیست طبقه ده (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی						کرگیری	پرکردن داکت اضافه	نصب تیر کنسول	آرمانتور و قالب کنسول	بتن کنسول (مکعب) متر
	یک رگ (متر طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)					
برآورد	۵۲۳	۱۴۱۲	۱۹۶	۴۲	۱۱۰	۳۹۰					۳
واحد ۱	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۷۵٪	۷۵٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۸۰٪	۷۵٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۸۰٪	۷۵٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۸۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۹۵٪	۹۰٪	۱۰۰٪	۵۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۹۵٪	۹۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	۴۹۷	۱۳۲۶	۱۹۶	۱۷	۲۸	۰					۱
درصد انجام شده در طبقه	۷۱٪	۴۳٪	۷۰٪	۸٪	۰٪	۰٪	۴۷٪	۰٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪
درصد انجام شده در طبقه	۹۵٪	۹۴٪	۱۰۰٪	۴۱٪	۲۵٪	۰٪	۱۰۰٪	۶٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪

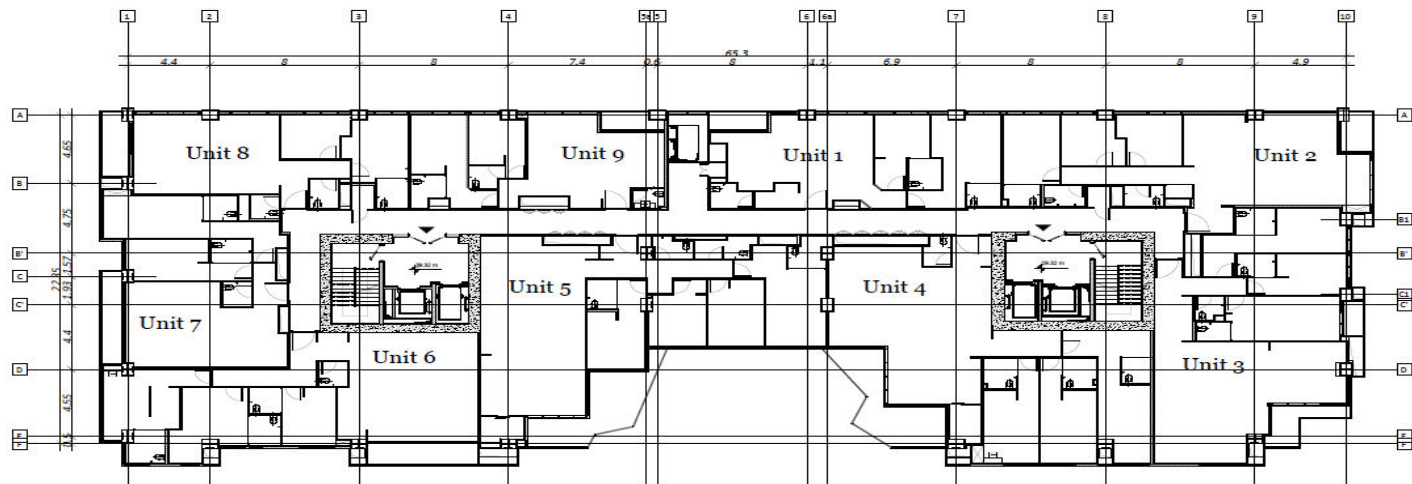


چک لیست طبقه یازده (پهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی						کرگیری	پرکردن داکت اضافه	نصب تیر کنسول	آرمانتور و قالب کنسول	بتن کنسول (متر مکعب)
	یک رگ (متر طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)					
برآورد	۵۲۳	۱۴۱۲	۱۹۶	۴۲	۱۱۰	۳۹۰					۳
واحد ۱	۹۵٪	۸۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۹۵٪	۸۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۹۵٪	۸۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۹۰٪	۴۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۵۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۹۵٪	۹۰٪	۹۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۹۵٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۹۰٪	۹۵٪	۹۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	۴۶۵	۱۰۲۸	۱۹۲	۰	۰	۰					۱
درصد انجام شده در طبقه	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪
درصد انجام شده در طبقه	۸۹٪	۷۳٪	۹۸٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪

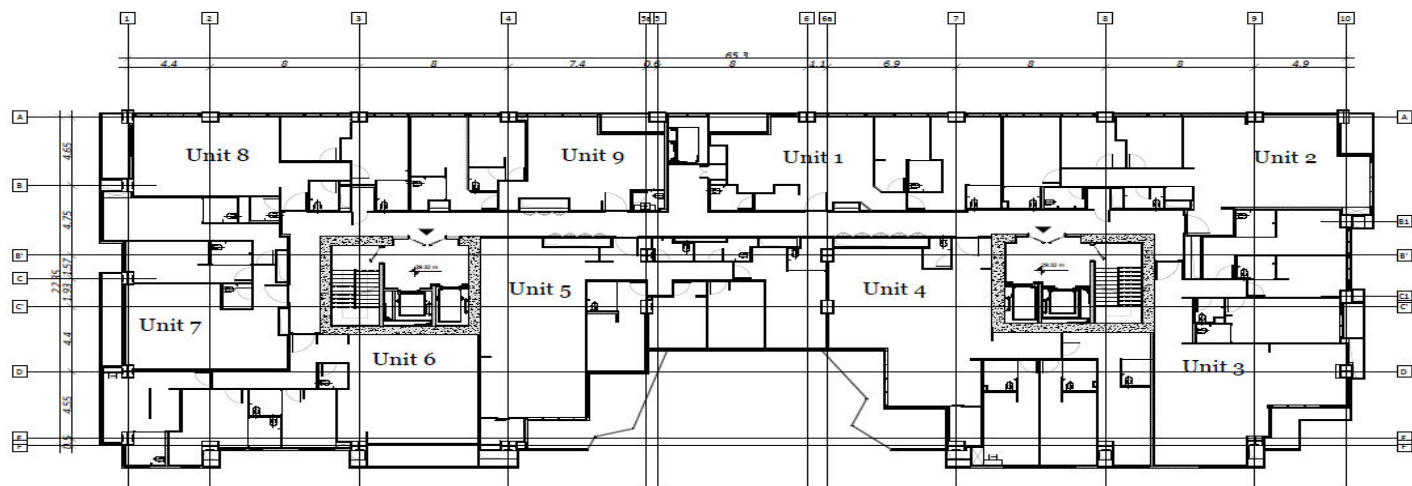

چک لیست طبقه دوازده (بهنگام شده ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴)

جبهه های کاری	دیوار چینی داخلی						پر کردن داکت اضافه	کمرگیری	نصب تیر کنسول	آرمانتور و قالب کنسول	بتن کنسول (متر مکعب)
	یک رگ (متر طول)	پنل وال کریت (متر مربع)	وال پست (عدد)	نعل درگاه (عدد)	وال پست (عدد)	پنل وال کریت (متر مربع)					
برآورد	۵۲۳	۱۴۱۲	۱۹۶	۴۲	۱۱۰	۳۹۰					۳
واحد ۱	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۲	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
واحد ۳	۰٪	۰٪	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪
واحد ۴	۰٪	۰٪	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۵	۰٪	۰٪	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۶	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۷	۰٪	۰٪	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۸	۰٪	۰٪	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
واحد ۹	۰٪	۰٪	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع کل انجام شده در طبقه	*	*	۲۸	*	*	*					۱
درصد انجام شده در طبقه	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪
درصد انجام شده در طبقه	۰٪	۰٪	۱۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۸٪	۲۸٪	۲۸٪

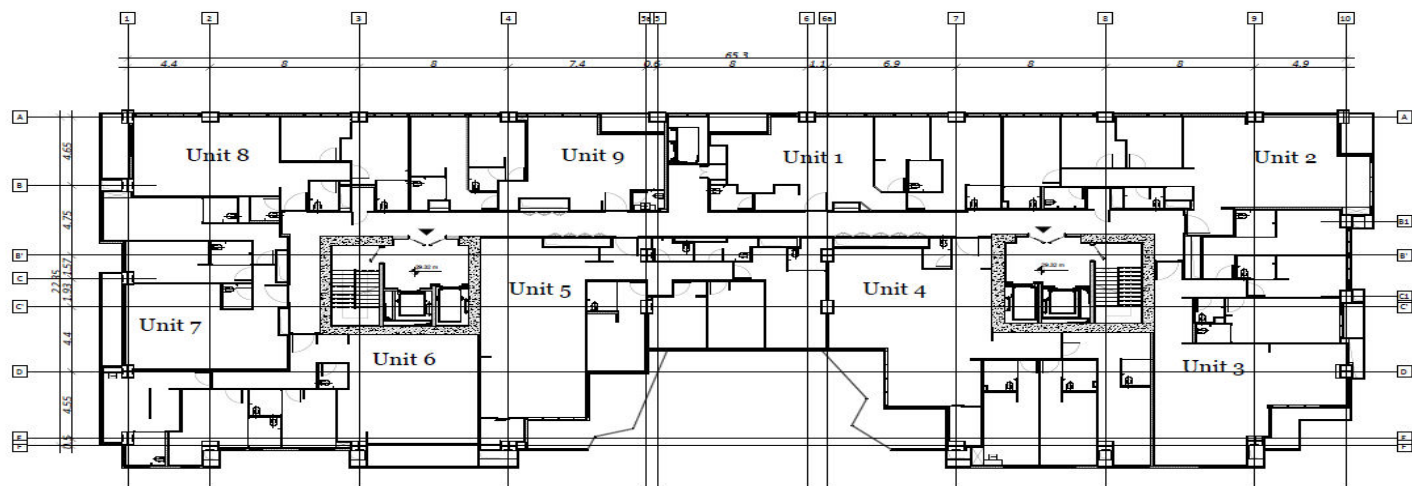


	گزارش پیشرفت ماهانه پروژه مجتمع مسکونی راز				
	موضوع	شماره گزارش	دوره گزارش	صفحه	
	برنامه ماه آینده	۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶	
ردیف	جبهه کاری				
۱	اجرای والپست پیرامونی شمالی				
۲	تکمیل تیغه چینی داخلی طبقات ۱۰ الی ۱۱				
۳	اجرای والپست و تیغه چینی طبقات ۱۲ الی ۱۳				
۴	آماده سازی دستک های کنسولی				
۵	ادامه نصب دستک های کنسول				
۶	مقاوم سازی و رفع نواقص طبقات زیرزمین				
۷	ادامه زیرسازی عایق حرارتی و پوشش اسکلت				
۸	اصلاح بازشوها و رایزها				
۹	شروع دیوارچینی باکس پله				
۱۰	شروع کانال فشار مثبت راه پله				
۱۱	اجرای داربست کانال فشار مثبت در باکس پله				
۱۲	ادامه کارهای چوبی و پارتیشن دفتر فروش				
۱۳	ایجاد زیرساخت برای اجرای نمای شمالی				
۱۴	ادامه عملیات کورگیری در طبقات				
۱۵	شروع به کار پیمانکار تاسیسات				
۱۶	شروع اجرای انباری ها				
۱۷	تکمیل جکوزی				
۱۸					
۱۹					
۲۰					
۲۱					
۲۲					
۲۳					
۲۴					
۲۵					
۲۶					
۲۷					

[illegible]

		گزارش پیشرفت ماهانه پروژه مجتمع مسکونی راز																																
		موضوع										شماره گزارش					دوره گزارش					صفحه												
		گزارش نیروی انسانی تعاونی (شیفت روز)										۱					۱۴۰۴/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۰۱					۱۷												
میانگین دوره	جمع نفر/روز (دوره)	نیروهای انسانی راز در روز																																
		شرح نیروی انسانی																																
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱				
تاور	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰			
ریگر و ماشین آلات	۱	۲	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۱	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۲	۲	۰			
HSE	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۲	۱	۰	۱	۲	۲	۲	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰			
جوشکار	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰			
خدمات	۳	۳	۳	۱	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۳	۳	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۳	۰			
کارگران	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۰			
جوشکار تقویت اسکلت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰			
اسکلت بتنی	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۴	۷	۹	۶	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰			
والکریت	۹	۹	۹	۰	۴	۸	۴	۰	۷	۷	۱۰	۱۰	۱۰	۱۲	۱۰	۱۰	۱۱	۱۰	۸	۰	۱۰	۱۰	۷	۶	۵	۰	۴	۸	۴	۰				
فقد حریق	۰	۳	۳	۰	۲	۲	۳	۴	۵	۵	۵	۰	۴	۴	۵	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۳	۲	۰	۰	۲	۲	۳	۰	۳			
چاه کنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جوشکاری اسکلت بتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰			
حفاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
خاکبرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پیمانکار متفرقه	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰			
جمع	۴۴	۴۸	۷	۵۲	۴۸	۴۹	۵	۴۷	۵۱	۵۳	۵۳	۵۸	۵۴	۱۲	۶۲	۶۳	۶۰	۶۵	۶۰	۵۶	۸	۵۶	۶۰	۵۸	۵۰	۵۲	۱۰	۵۹	۶۱	۱۴۲۹				

گزارش پیشرفت ماهانه پروژه مجتمع مسکونی راز

موضوع	شماره گزارش	دوره گزارش	صفحه
گزارش تصویری	۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰

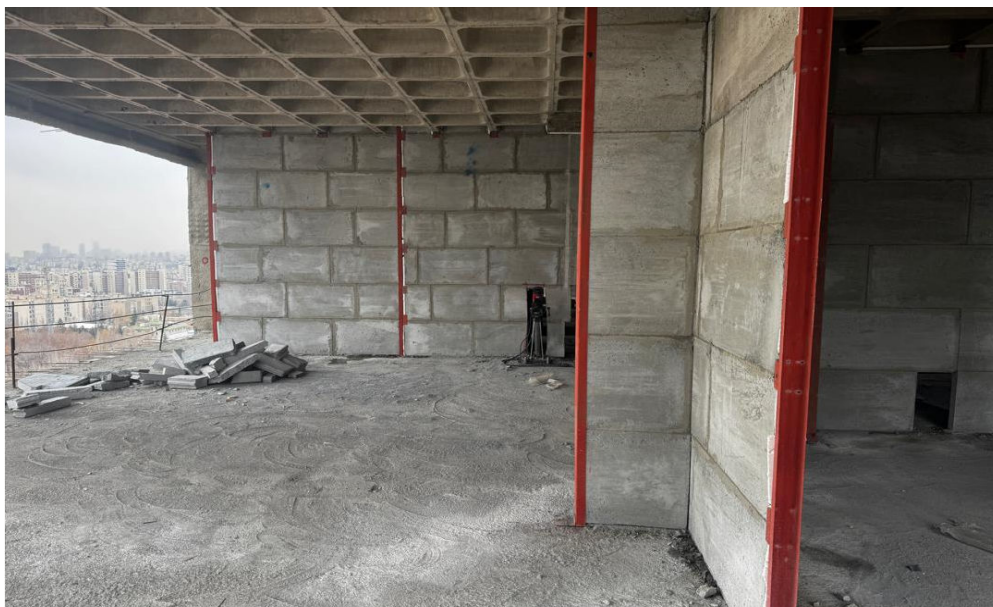

اجرای الکتریت




اجرای والپست

گزارش پیشرفت ماهانه پروژه مجتمع مسکونی راز

موضوع	شماره گزارش	دوره گزارش	صفحه
گزارش تصویری	۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۱




گونی کشی طبقات برای شات زنی

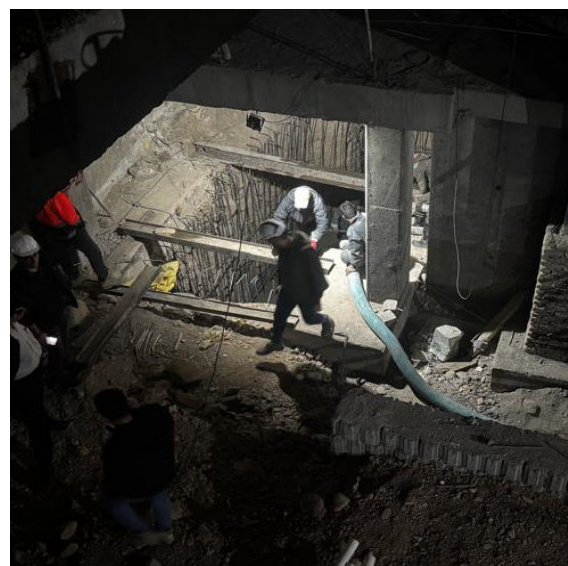

بتن ریزی استخر و پمپ خانه


گزارش پیشرفت ماهانه پروژه مجتمع مسکونی راز

موضوع	شماره گزارش	دوره گزارش	صفحه
گزارش تصویری	۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۲

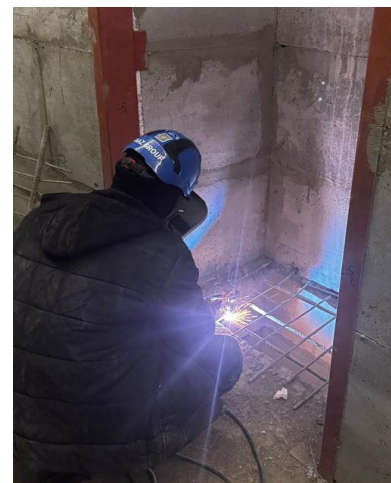


نقاشی دفتر فروش

اجرای حفاظ داکت ها

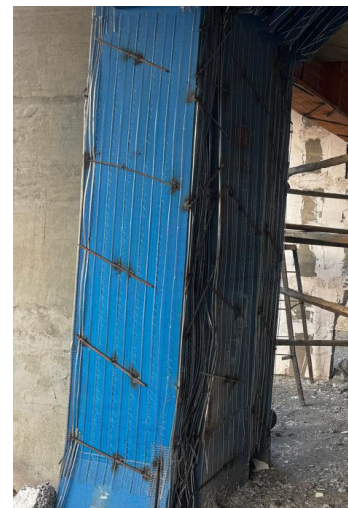

گزارش پیشرفت ماهانه پروژه مجتمع مسکونی راز

موضوع	شماره گزارش	دوره گزارش	صفحه
گزارش تصویری	۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳

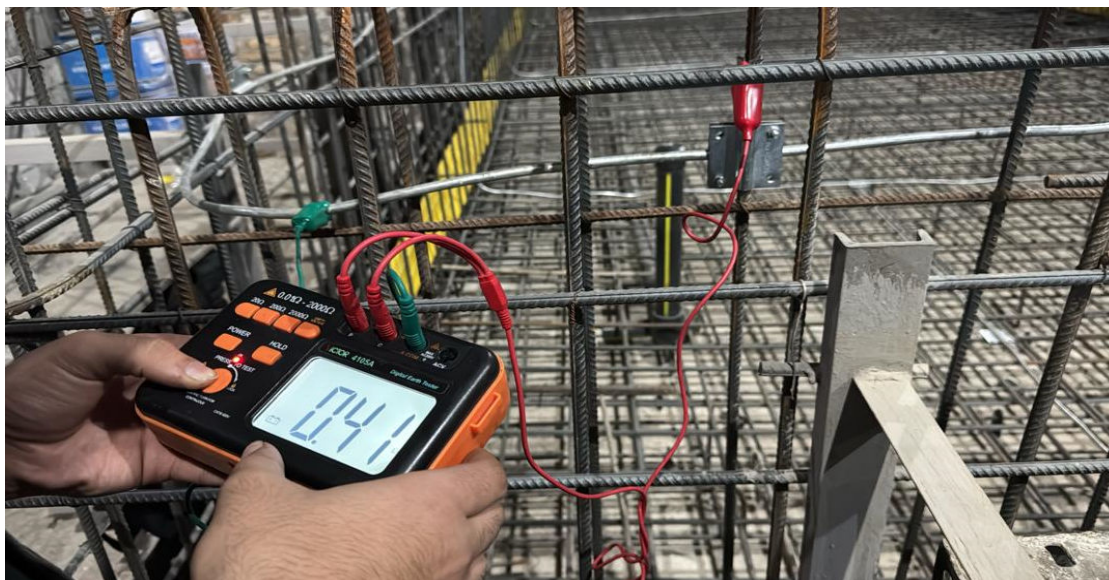

تست ارت استخر



تخریب دیوار طبقه اول



کور گیری
